

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 021 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, **29 ENE 2021.**

**VISTO:**

El Informe N° 016-2021-620-RO-RSADCT-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 25 de enero de 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por Partidas Nuevas, Deductivo N° 02 y Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra: **"REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440.

El Informe N° 013-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 29 de enero del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por Partidas Nuevas, Deductivo N° 02 y Ampliación de Plazo N° 04.


**CONSIDERANDO:**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 357-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de octubre del 2019, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440, con un presupuesto de inversión de S/. 2'154,134.47 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 47/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°412-2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de octubre del 2019, se aprueba el Plan de Trabajo, para la IOAR: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**, por un monto de inversión de S/.1'235,452.25.

Mediante MEMORÁNDUM N° 019-2020-620-EPS TACNA S.A., de fecha 27 de Mayo del 2020, se da la encargatura como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para el proyecto: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA. LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante MEMORÁNDUM N° 001-2020-340-EPS TACNA S.A., de fecha 15 de enero del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. Ulianov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

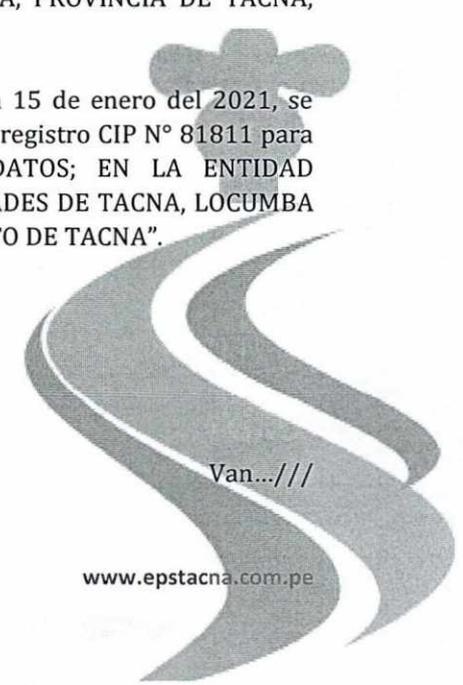

EPS TACNA S.A.  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
09 FEB 2021  
Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

EPS TACNA S.A.  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
09 FEB 2021  
Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

(02 Ejemplares)

EPS TACNA S.A.  
Entidad Prestadora de Servicios  
09 FEB 2021  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

E.P.S. TACNA S.A.  
GERENCIA DE INGENIERÍA  
10 FEB 2021  
Registro: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

con sust.

Eli x O S y C

10/02/21

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°226-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de agosto del 2020, se Aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 114 días calendario para la Obra: "REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 016-2021-620-RO-RSADCT-ATGH-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por Partidas Nuevas, Deductivo N° 02 y Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra detalla mediante cuadro adjunto:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO I (1)	ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N° 02 (2)	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO II (4) = (1) + (2) - (3)
1	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	S/. 1'682,860.37	S/. 1'762,434.91	S/. 350,260.77	S/. 317,181.81	S/. 1'795,513.87
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE CATASTRO	S/. 119,168.96	S/. 119,168.96	S/. 0.00	S/. 33,078.96	S/. 86,090.00
3	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE CATASTRO	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 10,000.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 1'812,029.33</b>	<b>S/. 1'891,603.87</b>	<b>S/. 350,260.77</b>	<b>S/. 350,260.77</b>	<b>S/. 1'891,603.87</b>
	GASTOS GENERALES (11.00 %)	S/. 199,323.23	S/. 208,076.43	S/. 38,528.68	S/. 38,528.68	S/. 208,076.43
	<b>COSTO DE OBRA</b>	<b>S/. 2'011,352.56</b>	<b>S/. 2'099,680.30</b>	<b>S/. 402,130.80</b>	<b>S/. 388,789.45</b>	<b>S/. 2'099,680.30</b>
	GASTOS DE ESTUDIO	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 25,000.00
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.00 %)	S/. 90,601.47	S/. 94,580.20	S/. 17,513.04	S/. 17,513.04	S/. 94,580.20
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.50 %)	S/. 27,180.44	S/. 27,180.44	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 27,180.44
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 2'154,134.47</b>	<b>S/. 2'246,440.94</b>	<b>S/. 406,302.49</b>	<b>S/. 406,302.49</b>	<b>S/. 2'246,440.94</b>

**CALCULO DE INCIDENCIA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
1	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	S/. 2'154,134.47	100.00%
2	MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO I	+ S/. 92,306.47	4.29%
3	MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO II	S/. 0.00	0.00%
4	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	S/. 2'246,440.94	104.29%

Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO UNICO. - APROBAR** el Adicional N° 02 por Partidas Nuevas con un presupuesto de S/. 406,302.49 (CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES), el Deducitivo N° 02 con un presupuesto de S/. 406,302.49 (CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES) y la Ampliación de Plazo N° 04 en 28 días calendarios; que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos Supervisión) será **SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL** para la Obra: "REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2447440, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

**Regístrese y Comuníquese**

  
  
**ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA**  
GERENTE GENERAL  
EPS TACNA S.A.

JASM/ERSC/UFK

- Cc. G. I. (con sustento)
- OAL.
  - GAF.
  - OPLA.
  - OSyC.
  - Archivo.

